



## PROTOCOLE D'ACCORD

**PA N° 041/2021-OSRO/CAF/003/EC-GADY**

Entre

L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO)

Et

L'ONG nationale Groupement Agropastoral pour le Développement de Yongoro (**GADY**)



## **RAPPORT DE PRODUCTION ET IMPACT**

**Le 14/06/2022**

-----  
**César-Balbanos NGONDA**  
**Chargé de Program. GADY.**  
**Contacts : 72391116/75355042**  
**Email : cesar.cpgady@gmail.com**

## **IDENTIFICATION DU PROJET**

**A: Titre du projet:** OSRO/CAF/003/EC « Assistance d'urgence pour le renforcement des capacités de la production alimentaire et de la résilience des populations vulnérables affectées par les conflits en République Centrafricaine »

**B : Montant total de la convention :** 18 692 500 (Dix-huit millions six cent quatre-vingt-douze mille cinq cent) FCFA.

**C : Situation de paiement (par tranche voir tableau ci-après)**

<b>TRANCHES</b>	<b>MONTANT F(CFA)</b>	<b>POURCENTAGE (%)</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
1	<b>9 346 250</b>	50 %	PAYE le 27/12/2021
2	<b>5 607 750</b>	30 %	NON PAYE
3	<b>3 738 500</b>	20 %	NON PAYE
<b>MONTANT TOTAL</b>	<b>18 692 500 FCFA</b>	<b>100%</b>	<b>RESTE 50% A PAYER</b>

**D : Situation des rapports**

<b>N°ORDRE</b>	<b>INTITULE DU RAPPORT</b>	<b>SITUATION DES RAPPORTS</b>
1	<b>Rapport d'identification et de planification</b>	Transmis à la FAO en février 2022
2	<b>Rapport formation et distribution</b>	Transmis à la FAO le 06/6/2022
3	<b>Rapport final (production et impact)</b>	En cours de rédaction
4	<b>Rapport financier final</b>	En cours d'élaboration

## RÉSUMÉ

La République centrafricaine continue à faire face à une situation sécuritaire très précaire. L'activisme des groupes armés et les conflits entre éleveurs et agriculteurs pour le contrôle des couloirs de transhumance (à la recherche des pâturages et d'eau) entravent les activités agricoles, d'élevage, de pêche, de chasse et de cueillette. Cela engendre également le déplacement massif des populations qui en général perdent leurs moyens d'existence et deviennent dépendant de l'aide alimentaire pour leurs besoins alimentaires et non alimentaires. A cela s'ajoute les restrictions des mouvements dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19. Après plusieurs évaluations de la situation de sécurité alimentaire et de celles des moyens d'existence qui ont été menées dans la zone de Bangassou et ses environs par l'ONG GADY, elle a sollicité et obtenu auprès de la FAO un fond (campagne maraîchère) afin de donner un « *Assistance d'urgence pour le renforcement des capacités de la production alimentaire et de la résilience des populations vulnérables affectées par les conflits en République Centrafricaine* » en apportant une aide monétaire (cash transfert) à travers le projet: **OSRO/CAF/003/EC-GADY**.

Ce projet est en cours de mise en œuvre, dans la zone de Bangassou et ses environs et touche 2 300 ménages bénéficiaires. Les populations de ces localités ont été rendues très vulnérables par la perte de leurs activités agricoles (grenier, semences, petit bétail et champs ou même le manque de récolte), suite aux crises qui ont secoué le pays. Le projet favorisera l'autonomisation alimentaire rapide des ménages qui pourront à travers les jardins communautaires et potagers se disposer des légumes pour leur autoconsommation d'abord et pour la vente de ces produits dans la ville de Bangassou et ses environs.

## **INTRODUCTION**

Suite aux crises militaro-politiques qu'a connus la République Centrafricaine, les Agences du Système des Nations Unies et les Organisations humanitaires ont lancé un appel consolidé pour apporter une réponse d'urgence à la population Centrafricaine affectée par les conflits armés. L'assistance porte essentiellement sur le cash transfert (aide monétaire), la FAO et le Fond Humanitaire visent à assister pour ce programme 2 300 ménages dans la ville de Bangassou et ses environs.

De son côté, le prestataire Groupement Agro-pastorale Pour le Développement de Yongoro (GADY), a travaillé étroitement avec les services déconcentrés de l'Etat centrafricain en occurrence l'ACDA (Agence Centrafricaine de Développement Agricole) avec l'implication étroite des leaders communautaires, le Maire, les Chefs de groupes et/ou des quartiers y compris les représentants des jeunes et femme.

### **I. RAPPEL DES OBJECTIFS DU PROJET**

#### ***1- 1 – Objectif général***

L'objectif principal du projet **OSRO/CAF/003/EC** «Assistance d'urgence pour le renforcement des capacités de la production alimentaire et de la résilience des populations vulnérables affectées par les conflits en République Centrafricaine» est de contribuer à améliorer la résilience des moyens d'existences des ménages vulnérables affectés par la crise.

#### ***1-2 – Objectifs spécifiques***

De façon spécifique, ce projet vise à :

- Sensibiliser et identifier 1000 ménages bénéficiaires dans la zone de Bangassou et ses environs additionnel pour le compte du projet : **OSRO/CAF/003/EC** et les mettre en groupement ;
- Sensibiliser et mobiliser les 1300 ménages bénéficiaires préalablement identifiés par la FAO en collaboration avec ACDA pour le compte du projet : **OSRO/CAF/003/EC**
- Confection des badges aux bénéficiaires pour faciliter leur identification le jour de la distribution;

- Renforcer la capacité des ménages bénéficiaires retenus par les différentes formations théoriques et pratiques sur la notion des nouvelles approches de production agricole et élevage.
- Installation de 20 Champ Ecole Paysan et suivi des 2300 ménages bénéficiaires après la distribution de cash ;
- Evaluation de l'impact du projet ;
- Rédaction des différents rapports ;

### ***1.3- Résultats attendus***

- Les Autorités Administratives locales et communautaires sont informées et sensibilisées sur le bien-fondé du projet ;
- Les quartiers et villages sont ciblés ;
- Les 80 Délégués Techniques Endogènes (DTE) sont identifiés et formés ;
- Les 2 300 ménages bénéficiaires directs du projet sont recensés en collaboration avec les Autorités locales mais surtout sur les critères définis par la FAO ;
- La liste des 2 300 ménages bénéficiaires est validée en présence des Autorités Administratives locales et communautaire.

## **II. IDENTIFICATION DES BENEFICIAIRES**

### **2-1 - Déroulement de l'identification**

L'identification des bénéficiaires s'est effectuée dans la période du 17 au 20 janvier 2022 pour la localité de Bangassou II plus précisément dans les villages de **BARAMA, MBALAZIME, YONGOSSABA, MAKEMBE, HAN-HOU, YONGOFONGO, NDEGUE, LANOME, NGBANDA, et GBANGA** .

### **2- 2- Identification des villages et des bénéficiaires**

- ***Ciblage des villages***

Les critères qui ont guidé le choix des villages ou quartiers par l'ONG GADY dans la ville de Bangassou et ses environs sont les suivants.

- Les villages ou quartiers où les populations ont subi des pertes de produits de récolte, des pertes du petit bétail, l'incendie des champs mais aussi d'autres critères de vulnérabilités

selon les rapports d'évaluations de la situation sécurité alimentaire de la République centrafricaine;

- Les villages ayant enregistré des personnes déplacées et qui n'ont jamais bénéficié d'une assistance humanitaire;

L'ONG GADY a donc été orientée vers les localités où les caractéristiques de vulnérabilité des villages et ou quartiers sont identiques aux critères arrêtés par la FAO.

Les autorités locales, les représentants des femmes des jeunes, les chefs du village et les collaborateurs de l'Agence Centrafricaine de Développement Agricole (ACDA) ont efficacement contribué à la réalisation des activités de ce projet.

Afin de pouvoir éviter les doublant dans les listes, l'équipe technique de l'ONG GADY a considéré un mécanisme de réseautage et les partages des informations avec le PAM et autres organisation travaillant dans le domaine de la sécurité alimentaire au travers des réunions de cluster (sécurité alimentaire) local pour la définition du mapping d'activité ce qui a permis à GADY de réduire très significativement les dédoublements.

**Tableau 1 :** Liste des localités ciblées pour réaliser les activités du projet.

<b>PREFECTURE</b>	<b>SOUS-PREFECTURE</b>	<b>COMMUNE</b>	<b>AXES</b>	<b>Quartier ou village</b>
<b>MBOMOU</b>	<b>BANGASSOU</b>	<b>BANGASSOU</b>	<b>BANGASSOU CENTRE</b>	NGOMBET, MADA-GRENGBANDA, NGUINDA-GBAGUI, MALIKO 1, BANGUI-VILLE 2, AOUYA, BOUKOUA, GAMBO, KOLONGO, MAHAMAT-PIKA, NGBINDA

		<b>ZANGANDO- MADABAZOUM A</b>	<b>BANGASSOU RAFAI</b>	HAN-HOU, YONGOFONGO, NDEGUE, LANOME, NGBANDA, GBANGA
		<b>VOUGBA- BALIFONDO</b>	<b>BANGASSOU FODE</b>	BARAMA, MBALAZIME, YONGOSSABA, MAKEMBE

Nous avons ciblé 10 localités ou villages dans Bangassou II pour la réalisation des activités du projet, dont quatre localités sont sur l'axe **Bangassou-Fodé** et Six sur **Bangassou-Rafai**.

Ensuite pour Bangassou centre, les localités qui ont été retenues étaient dans le 1<sup>er</sup> arrondissement, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> arrondissement (Bangui-ville, Maliko et Tokoyo).

- ***Ciblage des ménages bénéficiaires***

Le ciblage des ménages bénéficiaires s'est fait par une approche collaborative lors des réunions de sensibilisation et de programmation des sensibilisateurs/mobilisateurs communautaires. Les descentes sur le terrain des agents sont appuyées par l'équipe projet de la sécurité Alimentaire, du partenaire Etatique(ACDA) et des leaders communautaires (chefs de villages) qui constituent un apport très utiles dans le ciblage des ménages bénéficiaires.

**Etape 1 : Sensibilisation des populations**

Les activités de cette première étape de l'identification des bénéficiaires ont essentiellement concerné :

- Rencontre avec les autorités administratives, techniques et locales pour les informer sur les aspects du projet ;
- Réunions d'information et de sensibilisation de la population sur les critères de vulnérabilité et sur la méthodologie de sélection des bénéficiaires en présence des

différents leaders du village (autorités locales, leaders des jeunes, leaders des femmes, leaders des allochtones...).

Les critères retenus de sélection présentés au cours de ces réunions de sensibilisation sont :

- Les ménages doivent avoir accès à la terre pour cultiver ;
- Présences des femmes enceintes ou des personnes handicapées ;
- Les déplacés sur cite ;
- Famille non déplacée vulnérables ;
- Des retournés récent ou spontanés ;
- Les ménages non assisté lors de la dernière crise ;
- Les petits producteurs sans ressources ;
- Les personnes vivant avec des maladies chroniques ou VIH ;
- Le ménage de famille d'accueil.

La sensibilisation de la population a porté sur les procédures de la distribution des transferts monétaires. Elle portait également sur le quota de ménages bénéficiaires ciblés et sur le montant que va recevoir chaque ménage retenu (30.000 FCFA par ménage bénéficiaire). En ce temps de sensibilisation, nous avons profité pour mettre l'accent sur l'importance de la formation axée sur l'approche Champ Ecole Paysan (CEP) et la mise en place des parcelles de démonstration. La phase de sensibilisation et mobilisation a concerné particulièrement Bangassou centre d'où l'identification des bénéficiaires a été effectué en amont.

### **Etape 2 : Recensement des bénéficiaires**

Le recensement des ménages bénéficiaires est fait par nos sensibilisateurs/mobilisateurs communautaires formés au préalable pour pouvoir bien mener le remplissage des fiches d'enquêtes sous la supervision des techniciens du département de la Sécurité Alimentaire de l'ONG GADY. Il est nécessaire de signaler que pendant le recensement des ménages bénéficiaires, les agents de l'ONG GADY ont aussi collecté les besoins des bénéficiaires en termes des spéculations et par types d'activités préférées.

### **Etape 3 : Validation des listes**

La liste est validée en étroite collaboration avec la population en présence des autorités locales des zones de la mise en œuvre du projet.

La liste consensuelle des bénéficiaires était arrêtée en fonction de l'engagement et de la détermination des populations, de l'appréciation des autorités locales et de l'équipe technique.

Les critères retenus (cités ci-haut) ont été rappelés à la communauté pendant la séance de la validation des listes. La liste des ménages bénéficiaires ont été validés par un comité constitué des deux chefs de groupes dont chacun des communes de Zangando-Madabazouma, Vougba-Balifondo et le responsable de la Jeunesse.



**Image 1 :** Validation de la liste des bénéficiaires en présence des autorités locales

Après la validation de la liste ainsi que la mobilisation des bénéficiaires de Bangassou centre, il a eu une période (07 au 12 février 2022) où les agents terrain de l'ONG GADY passent dans les quartiers et villages pour faire les photos 4X4 aux bénéficiaires afin de leur confectionner des badges selon ce qui est prévu dans le protocole du projet.



**Image 32:** Confection des badges aux bénéficiaires

Dans le souci de bien mener les activités dudit projet, nous avons établi un planning d'activité en tenant compte des dates établies par la FAO. Le planning tient compte de :

- Sensibilisation, l'identification et mobilisation des bénéficiaires ;
- La confection des badges pour l'identification des bénéficiaires ;
- La formation (théorique) des bénéficiaires ;
- La mise en place des parcelles de démonstration (formation pratique);
- La préparation du transfert en regroupant les bénéficiaires ;
- L'organisation de la distribution du cash transfert ;
- Le suivi et encadrement des bénéficiaires ;
- L'Evaluation des productions et de l'impact de l'appui ;
- La rédaction des rapports

### **III. RECEPTION, DISTRIBUTION DES CASH TRANSFERT DANS LA VILLE DE BANGASSOU ET SES ENVIRONS**

#### **3-1 Rappel sur l'échec de premier paiement de cash transfert de 1 300 ménages bénéficiaires dans la ville de Bangassou et ses environs**

Il est à rappeler que ces même projet a été porté par une autres organisation pour l'encadrement de 1 300 ménages et cela n'a pas aboutis a sa terme car plusieurs paramètres ne sont pas present en comptes tels que la non consultation des responsables chargé du projet au niveau de la FAO par l'ONG partenaires, la non implication des autorités locales dans tous les activités du projet (identification, sélection, validation de la liste des bénéficiaires, la formation ainsi que la distribution de cash). Tous ces paramètres ont causé des tors lors de la distribution de cash en Aout 2021 a Bangassou, d'où l'argent n'a pas été distribué aux bénéficiaires, car il y avait un conflit par rapport aux listes des bénéficiaires, l'ONG partenaires a apporté sa liste et les autorités locales aussi ont amené leur liste. Alors l'argent a passé plus de quatre jours dans la ville sans être distribué et on a ramené à Bangui.

#### **3-2 Distribution de cash fait par ECOBANK appuyé par la FAO et l'ONG GADY dans la ville de Bangassou et ses environs pour les 2 300 ménages**

##### **Réception des lots destinés à la distribution**

Dans la journée du 26/05/2022 aux environs de 10h45min une équipe composée d'un comptable de l'ECOBANK et un représentant de la FAO est venue de Bangui. Au cours de leur mission ils ont apporté un portefeuille de **69 000 000 FCFA** (Soixante-neuf millions de francs CFA). Cette somme est gardée par le comptable de l'ECOBANK avec l'appui sécuritaire des forces de sécurité intérieur (Police et la gendarmerie). L'argent correspond bien au nombre total (**2300**) des bénéficiaires de cash transfert de Bangassou et ses environs.

##### **Distribution des cash**

Les kits à distribuer était de l'argent liquide que doit recevoir chaque bénéficiaire dont la somme total est **69 000 000 FCA** (Soixante-neuf millions de francs CFA). Cependant chaque bénéficiaire a perçu **30 000 FCA** (Trente-mille francs) et le nombre est total des bénéficiaires

était de 2300 soit 1300 pour Bangassou centre et 1000 pour la commune de Vougba-Balifondo et Zangando-Madabazouma.

### **Déroulement de la distribution**

Les activités de la distribution de cash transfert dans la ville de Bangassou et ses environs se sont déroulées **Du vendredi 27 au Lundi 30 Mai 2022 au stade TATA SAYO de Bangassou** pour une durée de 4 jours. Comme il était prévu dans le protocole d'accord, chaque ménage a bénéficié d'une somme de 30 000 FCFA. Au total 1197 ménages ont été payés pendant cette période de distribution. Cette activité a été commencée par la sensibilisation des ménages bénéficiaires, leur regroupement le jour de transferts et leur reconnaissance. Tout a commencé aux environs de 8h30min par une cérémonie officielle de la distribution en présence des autorités locales, des partenaires Etatiques en occurrence ACDA et le représentant de la FAO. Rappelons que la distribution a eu lieu au stade TATA SAYO de Bangassou. Des séances des allocations ont été présentées en commençant par le Monsieur le Maire. Après vient le chargé de programme de l'ONG GADY qui a présenté le projet et le nombre des ménages bénéficiaires ainsi que les différents localités qui abrite le projet. Puis s'en est suivi le tour de la Représentante de la FAO et d'un représentant de l'ACDA. Et par la fin une allocution du Madame la Préfète du Mbomou, suivis du paiement symbolique fait par Madame la préfète du Mbomou avec une photo de famille, enfin le plan de distribution fût présenté aux bénéficiaires par le protocole s'était la fin de cérémonie. Cependant le reste de la distribution s'est poursuit par une méthode qui consiste par appel des noms selon l'ordre alphabétique puis vérification des cartes pour identifier le bénéficiaire et ainsi minimiser au maximum les fraudes. Avant de percevoir l'argent le bénéficiaire emmarge puis prend l'argent pour laisser la place au prochain appelé. La distribution a durée quatre jours allant du 27-30 Mai 2022. Il est à signaler que la distribution s'est bien passée sans incident majeur grâce à l'appui sécuritaire des forces de sécurités intérieur et aussi grâce à une bonne organisation et maitrise des activités par l'équipe du projet de GADY.



**Image 3 :** Allocution de madame préfète



**Image 4:** Allocution du représentant de la FAO



**Image 5:** Paye symbolique par le maire de Bangassou



#### IV. ACTIVITÉS DE FORMATIONS

Dans le cadre du projet OSRO/CAF/003/EC « *Assistance d'urgence pour le renforcement des capacités de la production alimentaire et de la résilience des populations vulnérables affectées par les conflits en République Centrafricaine* » qui prévoit un appui monétaire aux 2300 ménages bénéficiaires répartis comme suit : 1300 ménages bénéficiaires initialement sélectionnés par la FAO dans la commune de Bangassou et 1000 ménages bénéficiaires identifiés par l'ONG GADY dans la commune de Vougba et Zangando en collaboration avec le service de l'ACDA et des autorités locales. Une séance de formation a été organisée dans la localité de Bangassou du 16 au 18 Février 2022, a Ecole de LANOME et MBALAZIME

Les 80 Délégués techniques Endogènes (DTE) ont été choisis par les bénéficiaires membres de leurs communautés. Une sensibilisation a été faite par l'équipe de terrain GADY pour informer les Autorités Locales et Administratives pour la tenue des sessions de formation. Les modules le programme de formation ont été élaborés en collaboration avec le service de l'ACDA et de l'élevage. A partir de 09 heures 00 minute, à lieu la formation des 80 DTE de Bangassou et ses environs. Les différentes étapes de formation ont consisté à :

##### **4.1. Formation théoriques des 80 DTE sur la technique de production animale et végétale**

L'équipe du projet constitué des agronomes en collaboration avec les staffs de l'Agence entrafricaine de Développement Agricole(ACDA) ont animé une session de deux (02) jours de formation théorique selon le plan de formation ci-après :

**Tableau 2 :** Chronogramme de formation théorique

Date	Titre de modules	Intervenants
16.02.2022	Cérémonie d'ouverture de la formation	ONG GADY
	Environnement de la culture maraichère	CS.ACDA
	Système de production des animaux d'élevage	CS. Elevage
	Marketing et commercialisation des produits maraichers	Equipe GADY
17.02.2022	Gestion des cahiers de champ	CS.ACDA
	Technique de conservation des légumes et fruits	Equipe GADY
	Technique de vulgarisation et d'animation	CS.ACDA



**Image 6:** Formation théorique des DTE



**Image 7:** Pose déjeunée lors de la cérémonie d'ouverture de formation théorique des DTE

#### **4.2. Formation pratique des 80 DTE.**

Le projet a aussi installé vingt (20) parcelles, ces parcelles de démonstration sont animées par les agents de l'ACDA et les agronomes de GADY pour plus renforcer la capacité des DTE qui devront à leur tour animé les CEP dans leur communauté. Rappelle que la formation des 80 DTE de Bangassou et ses environs ont été supervisés par l'équipe de l'ACDA, et l'équipe GADY. La formation ses basée sur le système de production végétale et animale, la pêche, et la pisciculture.



**Image 8** : Formation pratique des pêches

#### **V. Installation des Champs Ecole Paysan (CEP)**

La commune de Zangando-Madabazouma et Vougba-Balifondo a été choisie pour l'installation des Champs Ecole Paysan (CEP). Ces champs sont installés pour la mise en place des cultures maraichères (jardin), cette initiative parait nouvelle pour la population de la zone et tout le monde voulait adopter cette innovations. 20 sites de CEP ont été installés dans les 10 villages cible du projet. La superficie de chaque site est de 750 m<sup>2</sup>. Les espèces mise en culture étaient de la tomate, du gombo, de l'amarante, l'épinard, du concombre, et de la carotte. Sur

chaque site on a confectionné 20 planches réparties en quatre blocs de 5 planches (CF plan de la parcelle).



**Image 9 :** Activités sur le site de NDEGUE

**Tableau 3.** Activités d’installations de CEP

<b>Activités</b>	<b>Périodes</b>	<b>Responsables de l’Organisation</b>
Indentification et délimitations des parcelles par village	Le 15 au 21 février 2022	Chargés terrain
Préparations (défrichage, labour piquetages)	Le 26 au 10 mars 2022	Chargés terrain
Semis	Le 10 au 16 mars 2022	Equipe projet
Suivis de la germination	Le 25 au 27 mars 2022	Chargés terrain
Sarclo-binages 1	Le 2 au 7 avril 2022	Chargés terrain
Traitement phytosanitaire	Le 10 au 14 avril 2022	Chargés terrain
Sarclo-binages 2	Le 20 au 24 avril 2022	Chargés terrain
Récolte échelonnée suivi de Commercialisation	Partir de 02 mai jusqu’à la fin de récolte	Chargés terrain
Collète des données de récolte et commercialisation par village	Le 10 au 15 juin 2022	Chargés terrain

**Tableau 4** : Liste des matériels remis à chaque village pour les activités de CEP

Villages	Houe Ceylan	Arrosoirs	Corde	Décimètre de 7, 5 m	Décimètre de 50 m
	Quantités				
HAN-HOU	02	02	04	02	02
YONGOFONGO	02	02	04	02	02
NDEGUE	02	02	04	02	02
LANOME	02	02	04	02	02
NGBANDA	01	01	02	01	01
GBANGA	03	03	06	03	03
BARAMA	02	02	04	02	02
MBALAZIME	02	02	04	02	02
YONGOSSABA	02	02	04	02	02
MAKEMBE	02	02	04	02	02
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

Il est à rappeler que tous ces matériels ont été achetés sur le budget propre de l'ONG GADY pour la bonne marche des activités d'installation des Champs Ecole Paysan (CEP).

Ces matériels ont été remis au président et les chargés des matériels des différents groupements du village avec une décharge officielle en collaboration avec les autorités locales, c'est pour faciliter les activités de labour préparation de lit de semences, semis et entretiens aussi quelques villages ont reçus d'un certains quantités des insecticides homologués sur le territoire nationale pour les traitements phytosanitaires. Chaque site de Champs Ecole Paysan est marqué par une pancarte imprimée avec des logos des partenaires, des bailleurs, et de l'organisation.


**Tableau 5** : Liste des semences remis à chaque village

Villages	Gombo	Amarante	Carotte	Epinard	Concombre
	Quantités				
HAN-HOU	40 g	40 g	20 g	40 g	40 g
YONGOFONGO	40 g	40 g	20 g	40 g	40 g

NDEGUE	40 g	40 g	20 g	40 g	40 g
LANOME	40 g	40 g	20 g	40 g	40 g
NGBANDA	20 g	20 g	10 g	20 g	20 g
GBANGA	60 g	60 g	30 g	60 g	60 g
BARAMA	40 g	40 g	20 g	40 g	40 g
MBALAZIME	40 g	40 g	20 g	40 g	40 g
YONGOSSABA	40 g	40 g	20 g	40 g	40 g
MAKEMBE	40 g	40 g	20 g	40 g	40 g
<b>Total</b>	<b>400 g</b>	<b>400 g</b>	<b>200 g</b>	<b>400 g</b>	<b>400 g</b>

Les semences utilisées sont des semences améliorées, hybrides F1, avec un pouvoir germinatif à 98 % et un taux d'humidité normal, adapté à la région. La quantité était répartie selon le nombre de sites de CEP dans le village. Les itinéraires techniques sont respectés les modes des semis, les entretiens, la récolte et la commercialisation. La suivis de ces activités sont assurées par les ingénieurs agronome de l'Organisation et collaboration avec les chefs de services de l'ACDA.

### Plan des parcelles des Champ Ecole Paysan (CEP)

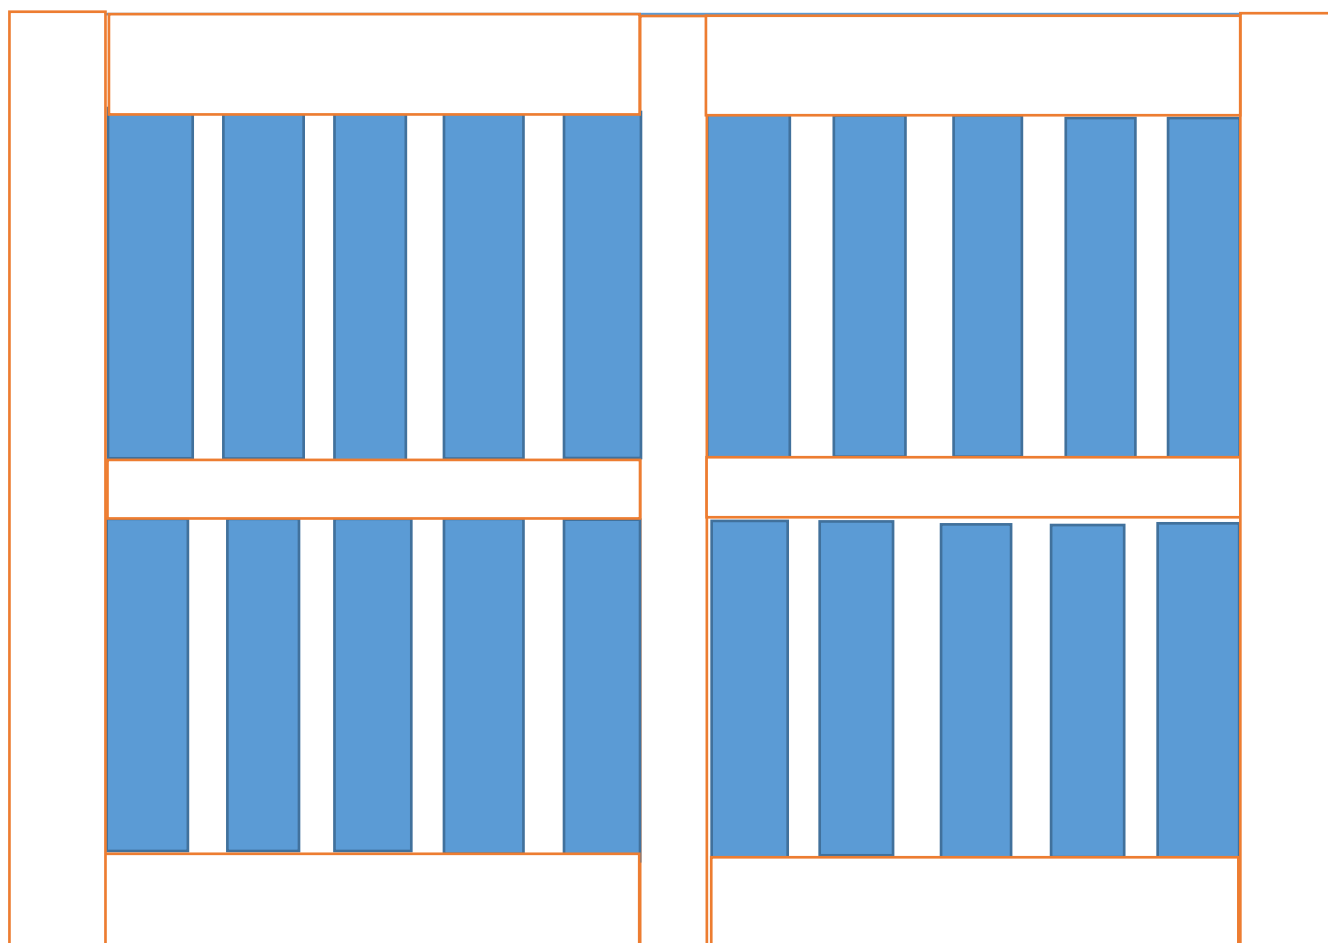

### 5.1. Superficies emblavées

Précisons que la superficie totale des 20 sites de Camps Ecole Paysan était de 2 ha. Chaque site est divisé à 4 blocs ou soles qui contiennent les différentes spéculations telles que le concombre, le gombo, l'amarante, l'épinard et la carotte. Les ménages bénéficiaires ont participé très efficacement aux installations des sites comme il était convenu lors des formations théoriques. Notons qu'ils ont fait preuve de maturité et de responsabilité dans tout leur engagement.



**Image 10:** Préparation et Semis sur le site de démonstration du village BARAMA

## VI. IMPACT DES ACTIVITÉS AGRICOLES

### 6.1 Rendement

La méthodologie utilisée pour la mensuration est d'abord la méthode quantitative à l'aide des questionnaires directs et des fiches de collecte de données réalisées lors des suivis par les agents du terrain de l'ONG GADY. Aussi la méthode qualitative est retenue à l'aide de focus groupe et des observations directs (observation agronomique et la pose de carrée de rendement). Ces méthodes ont pour but de quantifier les données collectées à l'aide de questionnaire et au traitement statistique des informations collectées.

Pour ce faire un responsable chargé de collecte M. ZIMAGUA LANGUE Dieu Béni (Superviseur à ONG GADY), accompagné des agents enquêteurs afin de collecter les données et, bénéficieront des soutiens des 80 délégués techniques formés, ensuite de procéder à la collecte des données. Toutes les zones identifiées et appuyées par l'organisation,

Il est à considérer que dans le cadre de cette culture maraîchère, l'estimation a été très facile dans le cadre où le nombre des parcelles emblavées pour l'obtention des planches et par spéculation favorisera la détermination du rendement soit vendu ou consommé et/ou gardé par chaque bénéficiaire / cuvette (NGAWI : unité de mesure).

**Tableau 6 : Résultats de surproduction vendus sur le marché local par village**

Villages	Quantité de gombo récolté en NGAWI	Quantité de l'amarante récoltée en NGAWI	Quantité de la carotte récoltée en NGAWI	Quantité de concombre récolté en NGAWI	Quantité de l'épinard récolté en NGAWI	Cout total de vente des produits de récoltes en FCFA
HAN-HOU	06	13	02	08	11	47 300
YONGOFONGO	02	03	01	07	10	31 800
NDEGUE	19	27	07	06	02	61 500
LANOME	04	09	00	11	10	28 000

NGBANDA	05	09	00	03	08	21 800
GBANGA	26	31	11	23	32	72 400
BARAMA	13	21	03	06	09	33 200
MBALAZIME	09	13	09	06	11	42 800
YONGOSSABA	03	14	07	09	10	46 000
MAKEMBE	11	09	03	11	10	47 200
<b>TOTAL</b>	<b>98</b>	<b>149</b>	<b>43</b>	<b>90</b>	<b>113</b>	<b>432 000</b>

Les surplus des produits récoltés sont vendus sur les marchés locaux et à des prix standard, la quantification n'est pas été exacte car d'autres produit sont vendus en botes soit en tas. Les femmes sont responsables de la vente et les recettes sont déposées dans la caisse de chaque groupement. Chaque groupement est dirigé par un président et un chargé de matériels choisis par les membres du groupement.

## **VII. Activités de l'élevage de pêche et de la pisciculture**

Parmi les 2 300 ménages bénéficiaires des cash transfert de la ville de Bangassou et ses environs d'autres ont choisis comme activités l'élevage de petit bétail, la pêche et la pisciculture. Ils ont été tous organisés en groupement de 25 personnes, formés par le DR de l'élevage et de santé animal et le DR des eaux et foret chasse, pêche et tourisme de Bangassou. Le suivi de leurs animaux, les mécanismes de reproduction et d'alimentation ont été ressorties lors de cette formation. Au total 40 groupements ont été mise en place. Pour la bonne marche de ses activités l'ONG GADY a mis à la disposition de ces bénéficiaires des quelques matériels et couple des races des caprins et volatils et alevins.



**Image 13** : Suivis des activités des pêcheurs aux près de la rivière Mbomou

**Tableau 7** : Répartition des ménages par groupement et par secteurs d'activités

Village ou quartier	Nom de groupement	Secteurs d'activités	Nombre des Bénéficiaires par groupement et par sexe		
			H	F	Total
<b>BARAMA</b>	TIKANANGBA	Elevage de caprin	19	6	<b>50</b>
	ABEDOUWE	Elevage de caprin	18	7	
NGOMBET 1	NZONI TI KEKEREKE	Pisculture	9	16	<b>75</b>
	GBOUNGANGOU	Pisculture	14	11	
	TAMBOULA	Elevage de volaille	19	6	
NGOMBET 2	BE OKO	Elevage de volaille	15	10	<b>75</b>
	TI MO SI	Pisculture	16	9	
	NOUVELLE VISION	Elevage de volaille	11	14	
BANGUI-VILLE 2	SOLUTION	Pisculture	10	15	<b>100</b>
	ANI MBOUKOU	Pisculture	9	16	
	TI KANA NGBA	Pisculture	13	12	

	SOUNGO NGBA	Pisculture	10	15	
YONGOSSABA	LE KA BE DA	Elevage de caprin	5	20	<b>50</b>
	GUIA MBISSA	Elevage de caprin	6	19	
KOLONGO	E LO BA ZO KO	Pêche	9	16	<b>100</b>
	KOUA NZONI	Pêche	8	17	
	BE OKO	Pêche	13	12	
	MABOKO MOSSORO	Pêche	5	20	
YONGOFONGO	GUIA MBISSA	Elevage de caprin	13	12	<b>50</b>
	NDILA BADO	Elevage de caprin	14	11	
MAHAMAT-PIKA	SOLUTION DE VIE	Elevage de caprin	12	13	<b>100</b>
	NOUVELLE ELAN	Elevage de caprin	13	12	
	FINI LA RECREATION	Elevage de volaille	13	12	
	JARDIN D'EDEN	Elevage de volaille	12	13	
LANOME	SOUNGO BE	Elevage de caprin	17	8	<b>50</b>
	BA SENDE BE	Elevage de caprin	18	7	
NGBINDA	BE OKO	Pisculture	12	13	<b>150</b>
	MBOU NI BE LI	Elevage de caprin	8	17	
	ANI GUINI TIRA NI	Elevage de caprin	13	12	
	MBOUYO	Elevage de caprin	17	8	
	KOUA TI MABOKO	Pêche	14	11	
	GUIGUI A KPINGBA	Pêche	15	10	
GBANGA	NVOGO GUELLA	Elevage de volaille	17	8	<b>50</b>
	ANI MBOUKOU	Elevage de volaille	17	8	
<b>TOTAL</b>			<b>434</b>	<b>416</b>	<b>850</b>

Au total 34 groupements de 25 personnes ont été optés pour les activités de pêche, l'élevage, et la pisciculture, dont 850 ménages parmi les 2 300 bénéficiaires de cash transfert ont choisis pour activités **Pêche, Elevage et Pisciculture**.



**Image 14** : quelques races des chèvres données aux ménages

**Tableau 8** : Liste des Kits remis aux différents groupements pour les activités de Pêche, Elevage, et la Pisciculture

Groupements	Caprins	Volailles	Alevins	Hameçons	Filets
	Quantités				
TIKANANGBA	04	00	00	00	00
ABEDOUWE	04	00	00	00	00
NZONI TI KEKEREKE	00	00	25 g	00	00
GBOUNGANGOU	00	00	25 g	00	00
TAMBOULA	00	05	00	00	00
BE OKO	00	05	00	00	00
TI MO SI	00	00	25 g	00	00
NOUVELLE VISION	00	05	00	00	00
SOLUTION	00	00	25 g	00	00
ANI MBOUKOU	00	00	25 g	00	00

TI KANA NGBA	00	00	25 g	00	00
SOUNGO NGBA	00	00	25 g	00	00
LE KA BE DA	04	00	00	00	00
GUIA MBISSA	04	00	00	00	00
E LO BA ZO KO	00	00	00	06 Boites	04
KOUA NZONI	00	00	00	06 Boites	04
BE OKO	00	00	00	06 Boites	04
MABOKO MOSSORO	00	00	00	06 Boites	04
GUIA MBISSA	04	00	00	00	00
NDILA BADO	04	00	00	00	00
SOLUTION DE VIE	04	00	00	00	00
NOUVELLE ELAN	04	00	00	00	00
FINI LA RECREATION	00	05	00	00	00
JARDIN D'EDEN	00	05	00	00	00
SOUNGO BE	04	00	00	00	00
BA SENDE BE	04	00	00	00	00
BE OKO	00	00	25 g	00	00
MBOU NI BE LI	04	00	00	00	00
ANI GUINI TIRA NI	04	00	00	00	00
MBOUYO	04	00	00	00	00
KOUA TI MABOKO	00	00	00	06 Boites	04
GUIGUI A KPINGBA	00	00	00	06 Boites	04
NVOGO GUELLA	00	05	00	00	00
ANI MBOUKOU	00	05	00	00	00
<b>TOTAL</b>	<b>52 Chèvres</b>	<b>45 Poules</b>	<b>200 g d'alevins</b>	<b>36 Boites d'hameçons</b>	<b>24 Boules de filets</b>

Au total 13 groupements ont choisis l'élevage de caprin et ils ont reçu 52 chèvres, 9 groupement ont choisis l'élevage de volaille (poulets locaux) et ils ont reçu 45 poules, 8 groupement sont optés pour la pisciculture et ils ont reçu 200 g des alevins dans leurs différents Etangs (bassin), et 6 groupement sont optés pour la pêche et ils ont reçu 36 boites d'hameçons et 24 boules de filets. Les groupements ont

choisis leurs différents secteurs d'activités et ils ont été accompagnés par les techniciens de l'ONG GADY et collaboration avec le service de l'élevage, des eaux et forêt.



**Image 16** : les volailles suivis par les ménages



**Image 17** : Récolte de l'amarante sur le site de démonstration du village MAKEMBE



**Image 18** : Récolte de la carotte sur le site de démonstration du village GBANGA



**Image 19** : Pancartes confectionnés



**Image 20** : Planche confectionné

## **CONCLUSION**

L'ONG GADY dispose des staffes qui sont des ingénieurs agronome et maîtrise la localité du projet, les processus d'identification et de l'organisation de distribution de cash transfert ont été maîtrisés.

En effet, pour cette phase de la partie des activités de la campagne maraichères (identification, cash et formation), le travail a été bien satisfaisant, Parce qu'aucun incident n'est produit et tous les bénéficiaires ont été servis. La participation des bénéficiaires dans les préparatifs de la cash et l'implication des autorités ont aussi contribué à la réussite de ces activités. Puis l'installation et le suivi des Champs Ecole Paysan (CEP) ont été faits par les agronomes de l'ONG GADY et celui de service de l'ACDA et de l'élevage.

Les bénéficiaires ont pris conscience de leurs potentialités, la poursuite de leur encadrement permettrait de renforcer leur résilience.

Les autorités administratives, locales et techniques ont souhaité qu'une initiative sur l'appui de la population sur la mise en place des Associations Villageoises d'Epargne et de Crédit (AVEC) dans la zone soit appuyé afin de booster l'économie locale

**Tableau I : Présente les résultats de l'identification des ménages bénéficiaires de cash transfert dans la ville de Bangassou II et la répartition des Ménages selon le genre et la vulnérabilité.**

N°	Quartier /Village	Nombre de ménages selon le genre			Nombre de ménages selon la nature de la vulnérabilité											
		Total	H	F	Retournés récents		Déplacer sur site		Accès à la terre pour cultiver		Présence des handicapés ou maladie chroniques		Famille non déplacées mais vulnérable		Autres (famille d'accueil vulnérable)	
					H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
1.	BARAMA	100	43	57	12	13	1	2	43	57	6	9	43	57	8	3
2.	MBALAZIME	100	70	30	2	9	0	0	70	30	4	11	70	30	7	5
3.	YONGOSSABA	100	41	59	6	5	0	0	41	59	4	5	41	59	12	6
4.	MAKEMBE	100	57	43	4	11	0	0	57	43	15	6	57	43	5	4
5.	HAN-HOU	100	39	61	5	23	0	0	39	61	4	9	39	61	9	12
6.	YONGOFONGO	100	56	44	17	20	0	0	56	44	21	12	56	44	11	5
7.	NDEGUE	100	49	51	5	7	0	0	49	51	5	3	49	51	4	17
8.	LANOME	100	57	43	19	9	0	0	57	43	5	6	57	43	8	12
9.	NGBANDA	50	27	23	23	3	0	0	27	23	9	4	27	23	6	13
10.	GBANGA	150	67	83	42	23	0	0	67	83	4	8	67	83	9	12
<b>TOTAL</b>		<b>1000</b>	<b>439</b>	<b>561</b>	<b>135</b>	<b>123</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>439</b>	<b>561</b>	<b>78</b>	<b>73</b>	<b>439</b>	<b>561</b>	<b>79</b>	<b>89</b>

D'après la répartition des sexes 56 % des femmes sont chef de ménages alors que les hommes représentent 43,9%. Selon les critères de vulnérabilité, presque 99% des bénéficiaires ont accès à la terre pour cultiver. Le pourcentage de la vulnérabilité est élevée chez des familles non déplacées mais vulnérables qui représente : 43,9 % chez les hommes et 56% pour les femmes. Notons que, la majorité des ménages bénéficiaires retenus dans la zone de mise en œuvre du projet ont sollicité à grande échelle les cultures maraichères : **Amarantes, gombo, épinards, concombre et tomate.**

**Tableau II : Procès-verbal de la distribution de cash transfert dans la ville de Bangassou et ses environs**

<b>Village ou quartier</b>	<b>Nombre des ménages prévus</b>	<b>Présents</b>	<b>Absents</b>	<b>Montants prévus pour un ménage</b>	<b>Somme total</b>
BARAMA	100	98	2	30 000	2 940 000
MBALAZIME	100	99	1	30 000	2 970 000
YONGOSSABA	100	99	1	30 000	2 970 000
MAKEMBE	99	99	0	30 000	2 970 000
HAN-HOU	100	100	0	30 000	3 000 000
YONGOFONGO	101	100	1	30 000	3 000 000
NDEGUE	100	99	1	30 000	2 970 000
LANOME	100	99	1	30 000	2 970 000
NGBANDA	50	50	0	30 000	1 500 000
GBANGA	150	149	1	30 000	4 470 000
BANGASSOU CENTRE	1300	1197	103	30 000	35 910 000
<b>TOTAL</b>	<b>2 300</b>	<b>2 189</b>	<b>111</b>	-	<b>65 670 000</b>

***NB : Reliquat : Trois millions trois cent trente mille francs CFA (3 330 000 FCFA)***

**Tableau III : Lieu des parcelles de Champ Ecole Paysan (CEP)**

Village ou quartier	Nombre de Parcelle ou site	Nombre des Bénéficiaires sur les parcelles		
		H	F	Total
BARAMA	02	57	43	100
MBALAZIME	02	64	36	100
MAKEMBE	02	45	55	100
YONGOSSABA	02	61	39	100
HAN-HOU	02	35	65	100
YONGOFONGO	02	37	63	100
NDEGUE	02	55	45	100
LANOME	02	35	65	100
NGBANDA	01	29	21	50
GBANGA	03	80	70	150
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>498</b>	<b>502</b>	<b>1000</b>

**Tableau IV : Répartition des ménages par groupement de 25 personnes**

Commune	Village	Noms du Groupement
Zangando-Madabazouma	HAN-HOU	1- ANIGUNITIRANI
		2- SOUNGUE NGBA
		3- HAN-HOU LONDO
		4- SOLUTION DE VIE
	YONGOFONGO	1- SOUNGOU NGBA
		2- TAMBOULA
		3- NVOGO GUELA
		4- ANI MBOUKOU
	NDEGUE	1- SOUNGAYO KA NA WE
		2- VOUNGA NGBA
		3- ABE DOUWE
		4- TI MO SI
	LANOME	1- BAWE NA DA
		2- ANI MBOUKOU
		3- ABA SOLLA
		4- NDILLA
	NGBANDA	1- DA NGBA WA NGUINZA
		2- GUITA MBISSA
		1- ESPOIR

	GBANGA	2- COALITION
		3- BIEN FAIT
		4- Jardin d'Eden
		5- SOUNGOU BE
		6- BE KANA MILI
Vougba-Balifondo	BARAMA	1- LEKA BE DA
		1- UNION FAIT LA FORCE
		2- BEOKO
		3- TOUMBA-NZARA
	MBALAZIME	1- BEOKO
		2- MABOKO NA MABOKO
		3- SOUNGAYO KANAWE
		4- NZONI TI KEKEREKE
	YONGOSSABA	1- SOUNGAYO KANA WE
		2- BA WE NA DA
		3- A BE DOU WE
		4- BE OKO
	MAKEMBE	1- GBANDAGBA
		2- TOUMBA-NZARA
		3- TIKANA NGBA
		4- GBOUNGANOU

**Tableau V : Equipes de pilotage du projet**

<b>Noms et Prénoms</b>	<b>Spécialité</b>	<b>Fonction dans l'Organisation</b>
César-Balbanos NGONDA	Ingénieur Agronome	Chef de projet sécurité alimentaire
Dieu-Béni ZIMAGA-LANGUE	Ingénieur Agronome	Responsable suivis et évaluations
Cyriaque BAPAI-BATTI	Technicien logistique	Assistant logistique
Christian GOUZO	Technicien en Agriculture	Assistant chargé terrain
Ismaël-Jean NGABALI	Technicien en Agriculture	Assistant chargé terrain
Paterne GANGA	Technicien en génie-civil	Mobilisateur Communautaire
Achille BISSAFI	Economiste	Mobilisateur Communautaire
Cynthia AKOUFA	Assistance soignant	Mobilisatrice Communautaire
Olivier KAITHO	Mobilisateur	Mobilisateur Communautaire
Olivier NGAMBI	Instituteurs	Mobilisateur Communautaire
Samuel KOZANGA	Assistance soignant	Mobilisateur Communautaire
Nadine KOULINDA	Mobilisatrice	Mobilisatrice Communautaire
Jeannette DABAZOUMA	Mobilisatrice	Mobilisatrice Communautaire
Abiella Fleur BASSOUMBA	Mobilisatrice	Mobilisatrice Communautaire
Adèle MERCI RAFAI	Mobilisatrice	Mobilisatrice Communautaire
Yaya YOUSOUF	Mobilisateur	Mobilisateur Communautaire
Simlice ZANZA-LIANDO	Instituteurs	Mobilisateur Communautaire
Hérodias GBAYA-ZINGUI	Informaticien	Mobilisateur Communautaire
Dieu-Béni TINZAPA-KETTE	Instituteur	Mobilisateur Communautaire

# ANNEXES



